
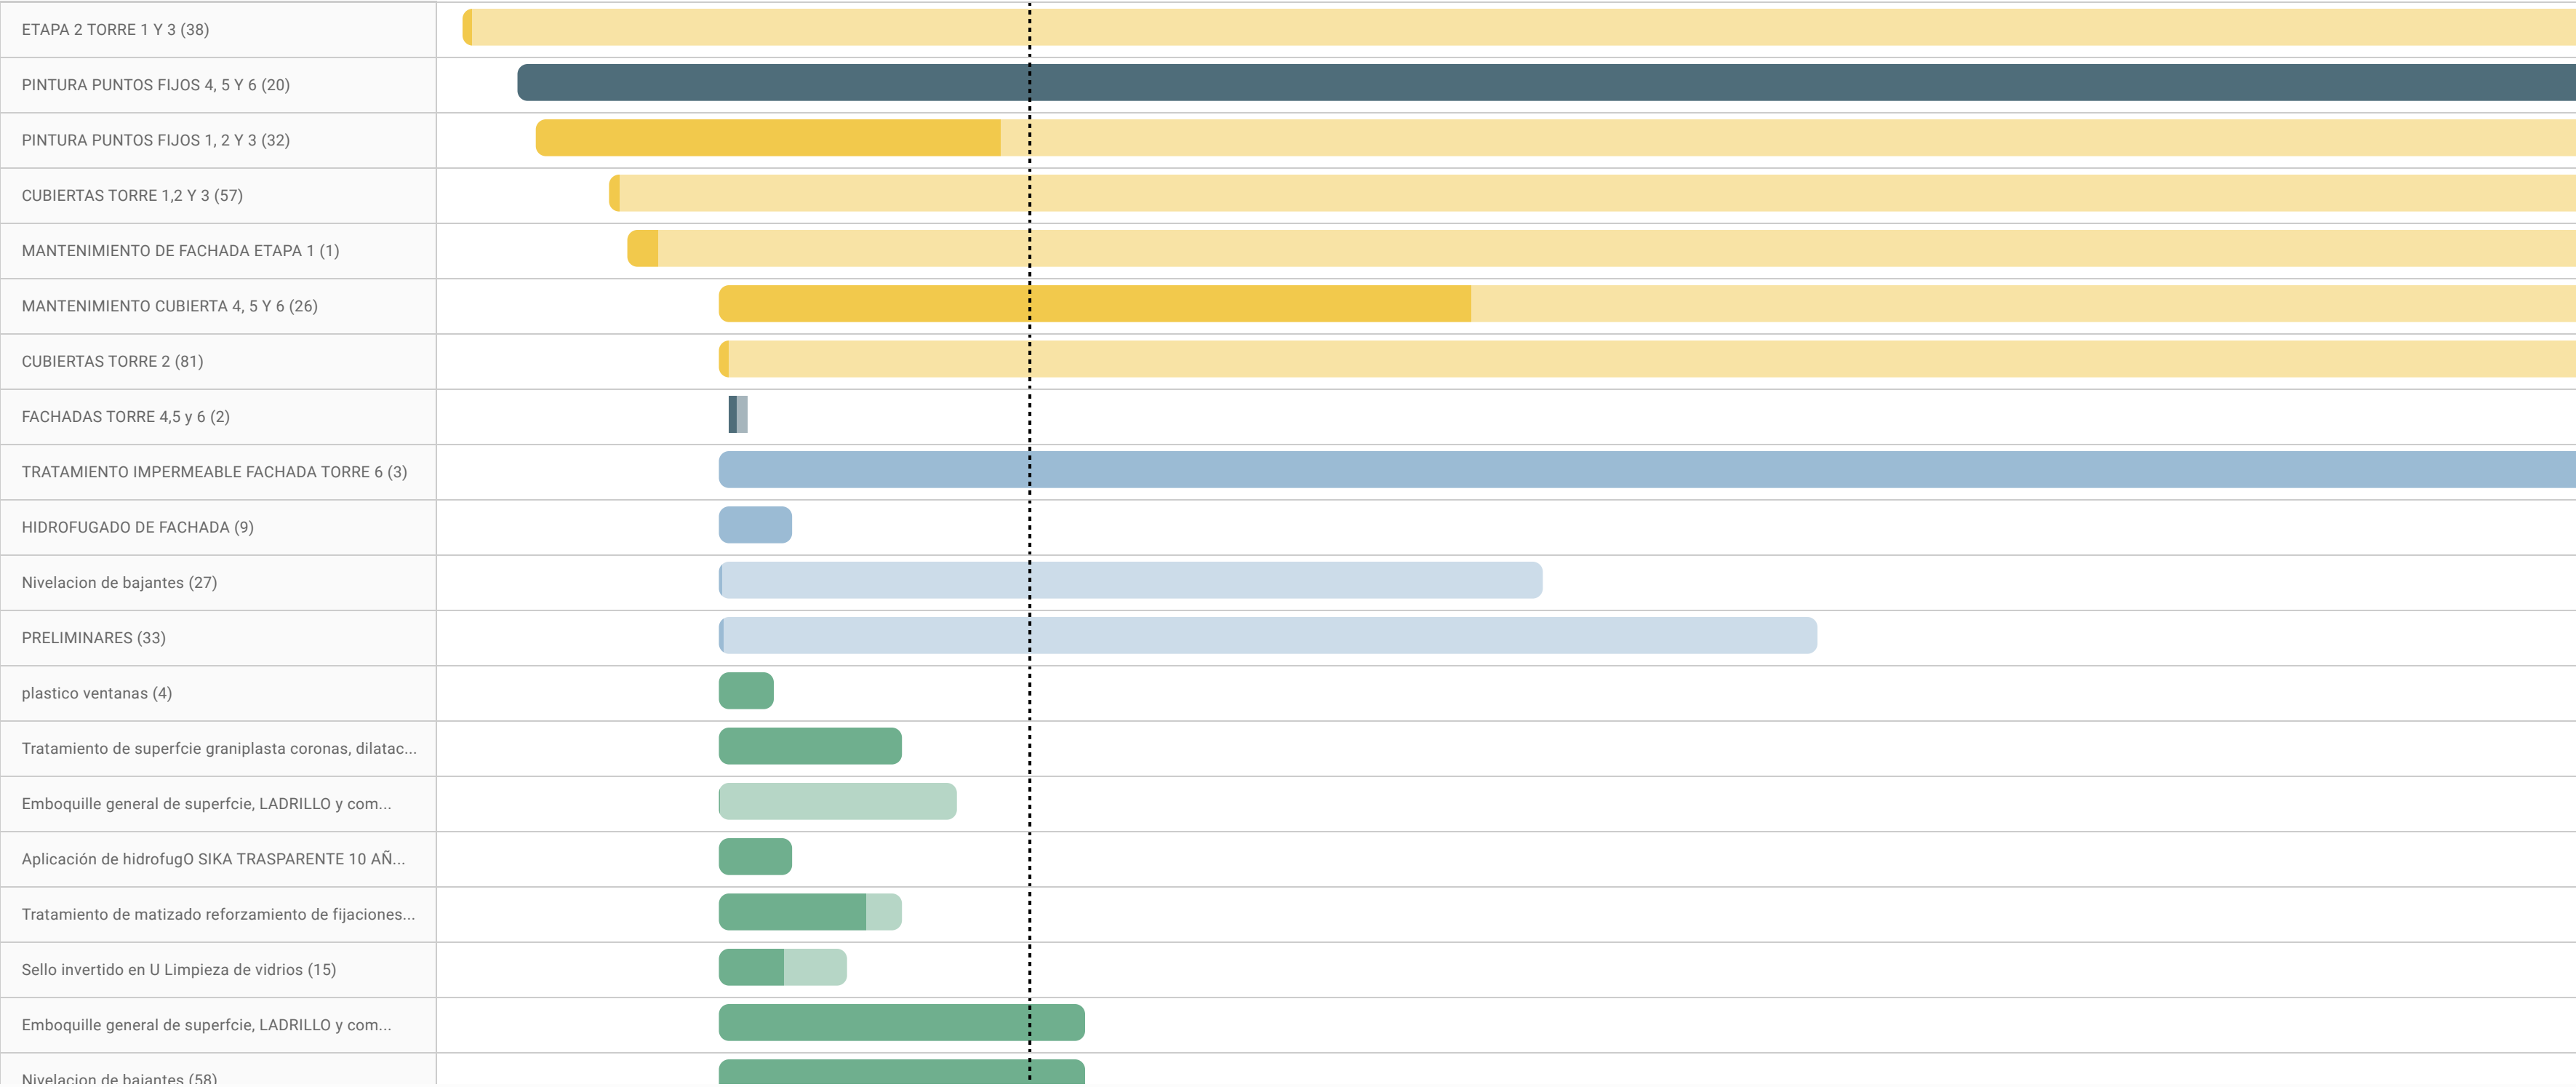


AVU Mazuren 16



12,66

Avance Proyecto (%)

13,19 %


Avance Entrega Total
Apartamentos%

38

Actividades Atrasadas

9,00

Cumplimiento
Cronograma (%)

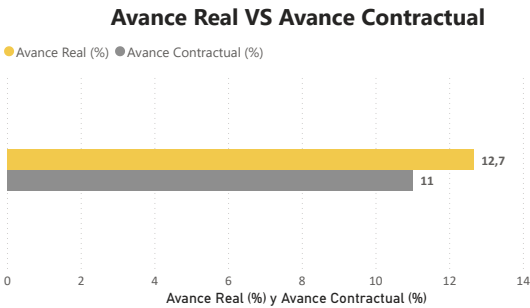

Torre	Apartamentos	Apartamentos Entregados
1	48	0
2	48	0
3	48	0
4	48	21
5	48	17
6	48	0
Total	288	38

